


Avancement des travaux

En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases.

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2017

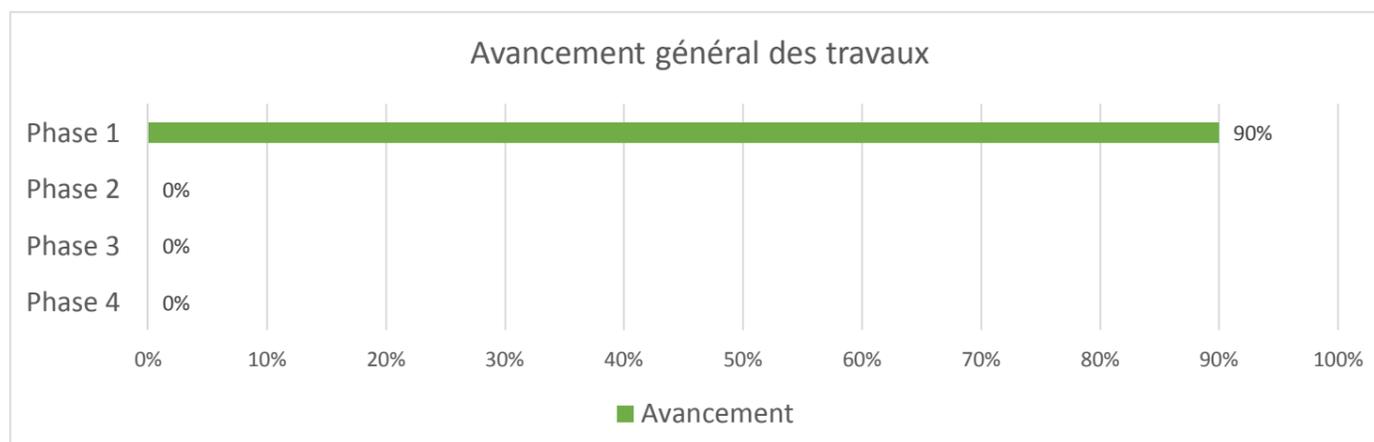

Actuellement, 90% de la phase 1 sont terminés

Fin prévue de la phase 1 : Mi-Juin 2014

Début programmé de la phase 2 : Juillet 2014

Le réalisé :

- ✓ Gros œuvre :
 - Construction de l'extension et de la chaufferie
 - Liaisons entre l'ancien et le nouveau bâtiment
- ✓ Etanchéité :
 - des nouvelles toitures
 - Pose des couvertines
- ✓ Isolation par l'extérieur du nouveau bâtiment
- ✓ Menuiseries extérieures du nouveau bâtiment
- ✓ Pose des menuiseries intérieures du nouveau bâtiment
- ✓ Plâtrerie (cloisons, enduits) du nouveau bâtiment
- ✓ Peinture : Préparation des fonds
- ✓ Sols souples : Réalisation des chapes salles de bain du nouveau bâtiment
- ✓ Chauffage et ventilation du nouveau bâtiment :
 - Chaufferie
 - Radiateurs
 - Réalisation de la sous-station extension
- ✓ Extérieur : Engazonnement, trottoirs, pose de bordures, Préparation voies d'accès et parkings

En cours :

- ✓ Plâtrerie (cloisons, enduits) de l'ancien bâtiment (Fait à 95%)
- ✓ Pose des faux plafonds du nouveau bâtiment (Fait à 95%)
- ✓ Peinture : Liaisons (Fait à 95%), nettoyage
- ✓ Sols souples : Pose des revêtements (Fait à 90%)
- ✓ Chauffage :
 - Ventilation (Fait à 90%)
 - Raccordement avec la Maison de Retraite existante
- ✓ Plomberie et sanitaires : Pose (Fait à 90%)
- ✓ Electricité du nouveau bâtiment :
 - Courant fort (Fait à 95%)
 - Courant faible (Fait à 90%)
- ✓ Extérieur : Goudronnage
