


Avancement des travaux

En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases.

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2017

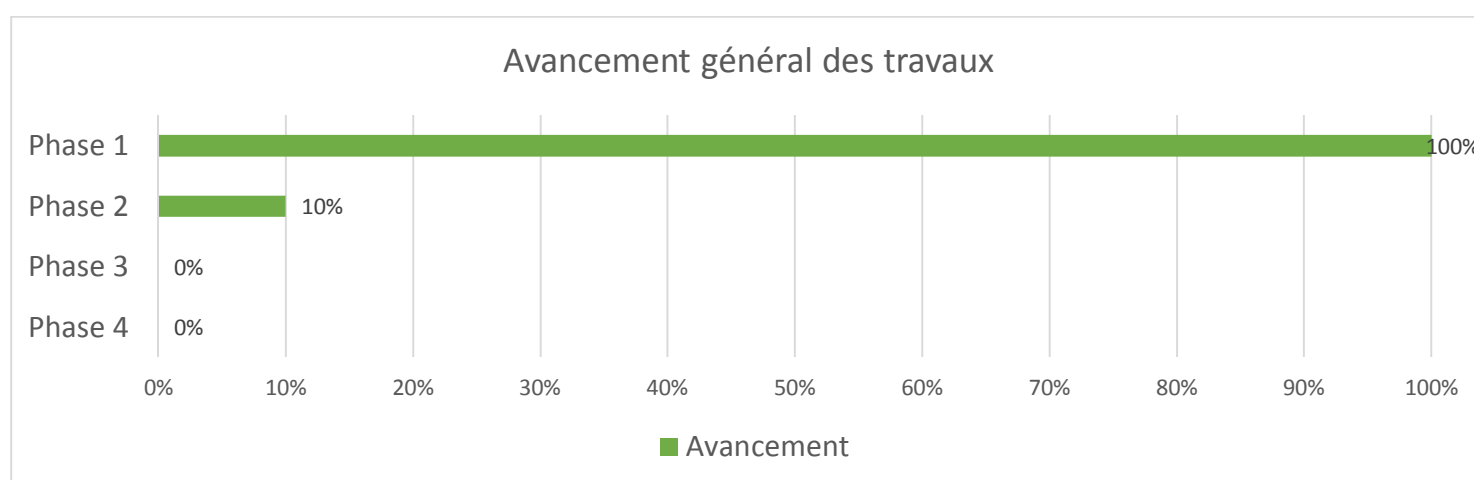

Actuellement, 100% de la phase 1 sont terminés

Début de la phase 2 : Septembre 2014

Fin programmée de la phase 2 : Décembre 2015

Le réalisé de la phase 1 :

- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie bois
- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie gaz
- ✓ Installation du nouveau groupe électrogène
- ✓ Changement du transformateur HT/BT
- ✓ Construction de l'extension (35 chambres individuelles, pièces communes, locaux techniques et bureaux divers)

Travaux prévus en phase 2 :

- ✓ Création de l'extension Aile B comprenant :
 - 17 chambres individuelles
 - Un PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés)
 - 2 salles à manger (Rez-de-Chaussée et 1^{er} Etage)
 - Une salle d'animation au Rez-de-chaussée
 - Les nouveaux bureaux administratifs
- ✓ Désamiantage :
 - Réseau vide sanitaire
 - Menuiseries extérieures
- ✓ Déplacement de la centrale oxygène

Le Réalisé :

- ✓ Cloisons séparatrices de l'aile B
- ✓ Terrassement de l'extension
- ✓ Fouilles et commencement des élévations
- ✓ Désamiantage des réseaux du vide sanitaire remplacés par du PVC

En cours :

- ✓ Déplacement du compteur gaz
- ✓ Réalisation de l'extension Aile B
