


Avancement des travaux

En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases.

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2017

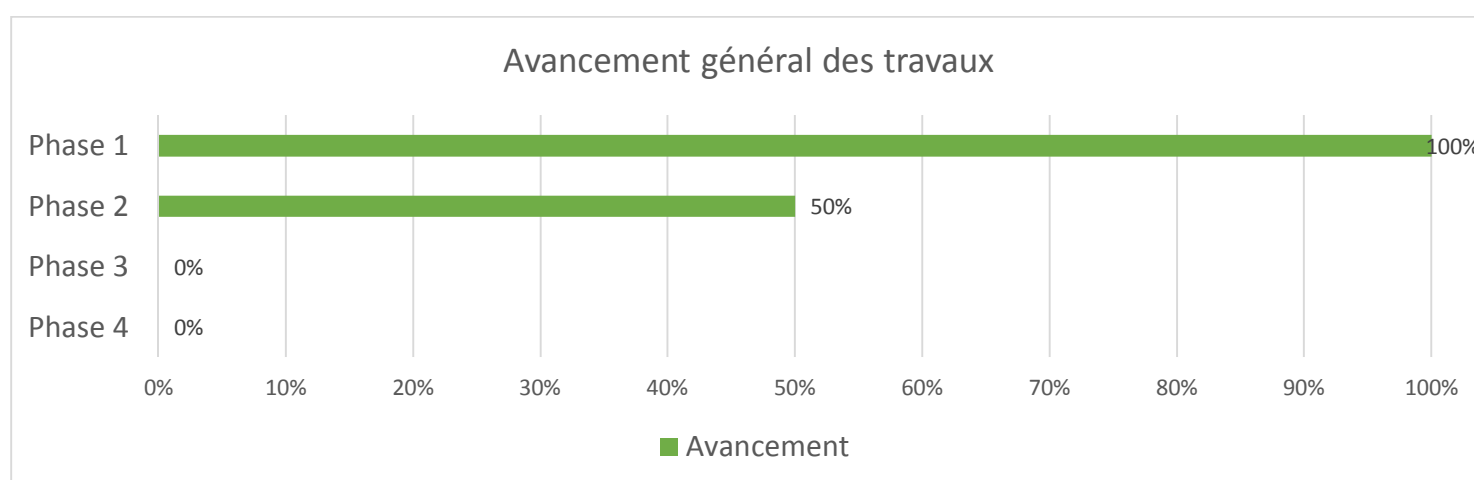

Actuellement, 100% de la phase 1 sont terminés

Début de la phase 2 : Septembre 2014

Fin programmée de la phase 2 : Fin 2015

Travaux prévus en phase 2 :

- ✓ Création de l'extension Aile B comprenant :
 - 17 chambres individuelles
 - Un PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés)
 - 2 salles à manger (Rez-de-Chaussée et 1^{er} Etage)
 - Une salle d'animation au Rez-de-chaussée
 - Les nouveaux bureaux administratifs
- ✓ Désamiantage :
 - Réseau vide sanitaire
 - Menuiseries extérieures
- ✓ Déplacement de la centrale oxygène
- ✓ Parking – voirie – abords

Le Réalisé :

- ✓ Gros œuvre extension Aile B jusqu'au 1^{er} Etage
- ✓ Gros œuvre PASA
- ✓ Désamiantage des menuiseries extérieures jusqu'au 1^{er} Etage
- ✓ Désamiantage des réseaux du vide sanitaire remplacés par du PVC
- ✓ Terrassement de l'extension
- ✓ Déplacement du compteur gaz
- ✓ Déplacement de la centrale oxygène

En cours :

- ✓ Gros œuvre extension Aile B des 2^{ème} et 3^{ème} Etages
- ✓ Extension Aile A
- ✓ Suite du désamiantage
- ✓ Sous œuvre (Electricité, plomberie, étanchéité, menuiseries)
