


Avancement des travaux

En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases plus une phase complémentaire

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2019

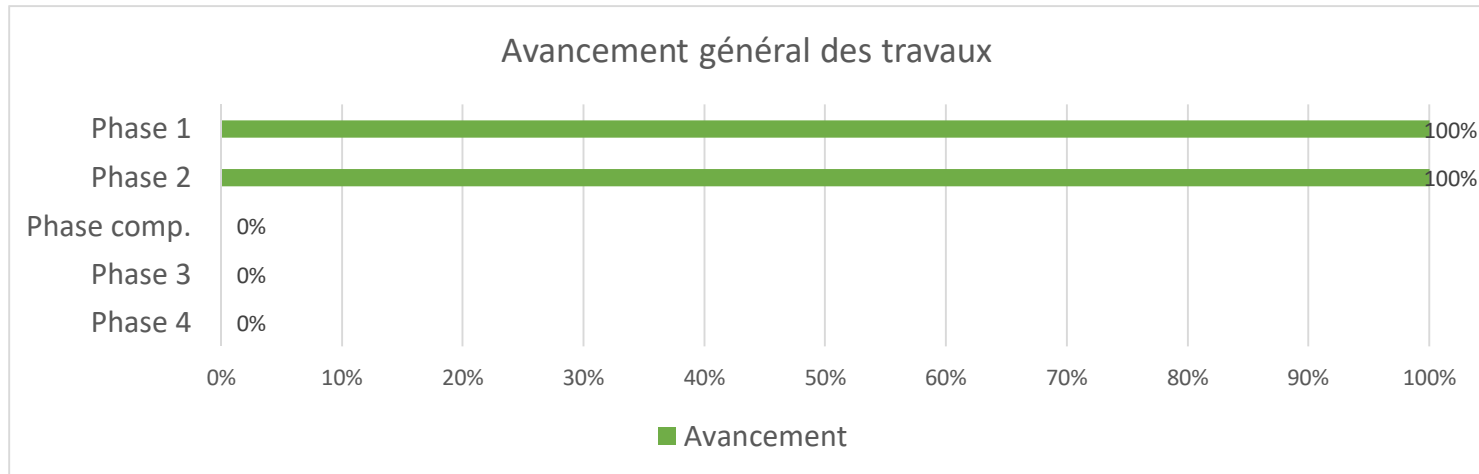

Les phases 1 & 2 sont entièrement réalisées

Début de la phase complémentaire : Juillet 2016

Fin programmée de la phase complémentaire : Juillet 2017

Travaux prévus en phase complémentaire :

- ✓ Réalisation d'une extension comprenant :
 - 14 chambres doubles (provisoirement jusqu'à la fin des travaux puis simples ensuite)
 - 1 salle à manger (R+1)
 - 1 cuisine au Rez-de-chaussée

Le Réalisé de la phase complémentaire :

- ✓ Plans et étude

En cours :

- ✓ Etude des sols
- ✓ Attribution des lots sur appels d'offre

Le Réalisé des phases 1 & 2 :

- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie bois
- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie gaz
- ✓ Installation du nouveau groupe électrogène
- ✓ Changement du transformateur HT/BT
- ✓ Construction de l'extension (35 chambres individuelles, pièces communes, locaux techniques et bureaux divers)
- ✓ Création de l'extension Aile B comprenant :
 - 17 chambres individuelles
 - Un PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés)
 - 2 salles à manger (Rez-de-Chaussée et 1^{er} Etage)
 - Une salle d'animation au Rez-de-chaussée
 - Les nouveaux bureaux administratifs
- ✓ Désamiantage :
 - Réseau vide sanitaire
 - Menuiseries extérieures
- ✓ Déplacement de la centrale oxygène
