


# Avancement des travaux

## En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases plus une phase complémentaire

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2019

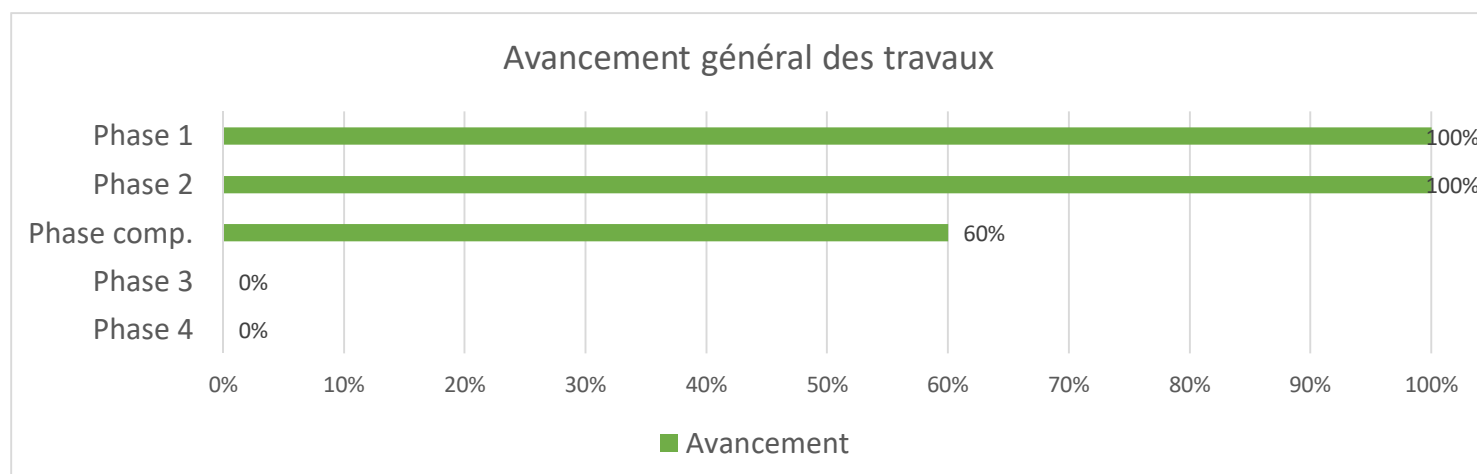

Les phases 1 & 2 sont entièrement réalisées

Début de la phase complémentaire : Juillet 2016

Fin programmée de la phase complémentaire : Juillet 2017

Début de la phase 3 : Septembre 2017

## Travaux prévus en phase complémentaire :

- ✓ Réalisation d'une extension comprenant :
  - 14 chambres doubles (provisoirement jusqu'à la fin des travaux puis simples ensuite)
  - 1 salle à manger (R+1)
  - 1 cuisine au Rez-de-chaussée

## Le Réalisé de la phase complémentaire :

- ✓ Plans et étude
- ✓ Etude des sols
- ✓ Gros œuvre
- ✓ Charpente - Toiture

## En cours :

- ✓ Travaux second œuvre (Plomberie, électricité, plaquiste, carrelage, ascenseur, cuisine, isolation extérieure...)

## Le Réalisé des phases 1 & 2 :

- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie bois
- ✓ Installation et mise en service d'une chaufferie gaz
- ✓ Installation du nouveau groupe électrogène
- ✓ Changement du transformateur HT/BT
- ✓ Construction de l'extension (35 chambres individuelles, pièces communes, locaux techniques et bureaux divers)
- ✓ Création de l'extension Aile B comprenant :
  - 17 chambres individuelles
  - Un PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés)
  - 2 salles à manger (Rez-de-Chaussée et 1<sup>er</sup> Etage)
  - Une salle d'animation au Rez-de-chaussée
  - Les nouveaux bureaux administratifs
- ✓ Désamiantage :
  - Réseau vide sanitaire
  - Menuiseries extérieures
- ✓ Déplacement de la centrale oxygène
